



# PÓLIZA



Período: 04-2019      Tipo: EGRESOS      Folio: 00000157      Cheque: 0026255016      Fecha: 04/04/2019      Estado: APLICADA  
Documento origen: 00000011 - EXPEDIENTE DE OBRA      Folio electrónico:  
Concepto: T.0026255016 CTA 5057 DHAC SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA ELECTRIFICACION LOCALIDADES LE ESPERANZA, LA CUESTITA Y TEPEHUAJE      Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III


## DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES

Cuenta	CTG	COG	CFU	EPROG -Actividad	Nombre	Debe	Haber
1.2.3.5.3.02.01	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	ELECTRIFICACIÓN EN LOCALIDADES : LA ESPERANZA, LA CUESTITA, EL TEPEHUAJE	\$498,500.00	\$0.00
1.1.3.4.1.005					DHAC SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$149,550.00
1.1.1.2.1.001.010					CTA. 00112695057 FONDO III 2019	\$0.00	\$346,801.30
2.1.1.7.4.01					5% AL MILLAR	\$0.00	\$2,148.70
Total						\$498,500.00	\$498,500.00

## DETALLE PRESUPUESTAL DE EGRESO

Cuenta	CTG	COG	FUN	Actividad	Nombre	Debe	Haber
8.2.4	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$498,500.00	\$0.00
8.2.2	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$498,500.00
8.2.5	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$498,500.00	\$0.00
8.2.4	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$498,500.00
8.2.6	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$498,500.00	\$0.00
8.2.5	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$498,500.00
8.2.7	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$498,500.00	\$0.00
8.2.6	2	61405	1.3.1	05.01.6.1.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$498,500.00
Total						\$1,994,000.00	\$1,994,000.00

**OPERADO  
FONDO III  
FISM-DF**



# PÓLIZA



Período: 04-2019      Tipo: EGRESOS      Folio: 00000157      Cheque: 0026255016      Fecha: 04/04/2019      Estado: APLICADA  
Documento origen: 00000011 - EXPEDIENTE DE OBRA      Folio electrónico:  
Concepto: T.0026255016 CTA 5057 DHAC SERVICIOS INTEGRALES DE  
INGENIERIA ELECTRIFICACION LOCALIDADES LE ESPERANZA,  
LA CUESTITA Y TEPEHUAJE      Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III

---

**OPERADO  
FONDO III  
FISM-DF**

---

**Elaboró**

**Revisó**  
SERGIO CORTES ESPINOZA

TESORERO

**Autorizó**  
JOSE LUIS CASTILLO GARCIA

PRESIDENTE

 **BBVA Bancomer**

04/04/2019 3:00:14 PM

COMPROBANTE


Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera


MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN ( GASTO CORRIENTE)

04/04/2019

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112695057
Cuenta de depósito:	0110743852
Nombre del tercero:	DHAC SERVICIOS INTEG RALES DE INGENIERIA SA D E CV
Importe:	\$346,801.30
Fecha de operación:	04/04/2019
Folio de Internet:	0026255016

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

OPERADO  
FONDO III  
FISH OF



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHAVINDA, MICHOACÁN 2018-2021



Chavinda, Michoacán a 02 de abril de 2019

OFICIO No. 043/OP/02042019

**C.P. SERGIO CORTÉS ESPINOZA**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitarle el pago de la siguiente factura que enuncio a continuación.

NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO	FONDO DEL PAGO	NOMBRE DE LA OBRA
DHAC SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA	\$ 346,801.30	FIII TRANSFERENCIA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: ELECTRIFICACIÓN EN LOCALIDADES: LA ESPERANZA, LA CUESTITA, EL TEPEHUAJE
SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 2,148.71	FIII	5 AL MILLAR

Sin más por el momento me despido de usted esperando una respuesta favorable a mi petición.

ATENTAMENTE

ING. DAVID NIÑO ZAVALA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

C. JOSÉ LUIS CASTILLO GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Folio Fiscal: 1aa08adc-f7fb-409c-8378-1670d08542d9  
Expedido en: 59800

Serie Folio: G 54  
Fecha: 02-04-2019 12:02:05

**DHAC SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA**

DHAC SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA RFC: DSI170607NX6  
603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

LA PEÑITA 106  
JACONA DE PLANCARTE CENTRO, CP 59800  
JACONA, MICHOACÁN, MEX  
Email: dhac@outlook.es Tel. (35) 1126 0101

**Cliente:** MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN **RFC:** MCM850101M45  
**Domicilio:** MORELOS No. 1 **Colonia:** CENTRO **CP:** 59580  
**Ciudad:** **Municipio:** CHAVINDA **Estado:** MICHOACÁN  
**Método Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos **Condiciones Pago:**  
**Uso CFDI:** P01 - Por definir

CÓDIGO	CLAVE PRODSERV	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
005	81141800	E48	1	No Aplica	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN CON PERIODO DEL 19/03/2019 AL 02/04/2018 RELATIVOS A LA OBRA: Electrificación en localidades: La Esperanza, La Cuestita, El Tepehuaje. OP/CHAV/04/AD/FI/III/032019	\$300,818.965517	\$300,818.97
\$ 429,741.38 IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS							
\$ 68,758.62 IVA							
\$ 498,500.00 TOTAL							
\$ 149,550.00 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%							
\$ 348,950.01 ALCANCE DEVENGADO							
\$ 2,148.71 5% MILLAR							
\$ 346,801.30 ALCANCE LIQUIDO							

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

SUB TOTAL	\$300,818.97
IVA %16 Traslado	\$48,131.04
<b>TOTAL</b>	<b>\$348,950.01</b>



No de Serie del Certificado del CSD:	00001000000406543029
Folio fiscal:	1aa08adc-f7fb-409c-8378-1670d08542d9
No de Serie del Certificado del SAT:	000010000000411500203
Fecha y hora de certificación:	02-04-2019 12:06:48

**OPERADO FONDO**

Sello Digital del CFDI

mOgkNeCoVS3j6An4ojU8scSc2rMMtA4jIT4YFdYzy/YpWA86/pdjh+DJV0bdkuIDSYmeuAGZ+plZj3/O8TOKUdcOyko1gtmVAKMsS/XVK3WlrfMqjz7AmRulJB9mr0ahPFBF7M93Qfjxo/uptXK3+dGgnXGPOsmgmbIKlcz55ras+Zu8loCG+EaTfdKlhC39IVU9Q7lyAKLTS+rOM7Qjuidg3oqjC5188GH892gkN3iAbmcgeZ9yVIQaaGj/sVom+99yu+k9CPgGYp9CZvXO8D8U/5d4d uxvAISo6YhzHQYHujDFXleYVRjNHkTw1nrEcsfvQpMgbBiUISHyUitEA==

Sello del SAT

TloaY5XTjAEQZVkhT3F8vao1gHROYHhNut/5XVf8y91eS8h1MOy4UskBsYfGeWcOnjK12TnK+9PneMcl/AxPFES0rts9vwwk3kko9zKWXKJ7AxEuzjfwdhEjL2rxgygkakAVbu711+YfzpeYpDCBG3prfmjmbOicZj0EPXxTujDWDt3trb+dcD5VIZUs9nq12MYRKJl4bhBxfARjIrmDGUKb2rrzTX9XwSZAqK8iKeyRIMt43R2Biau0a3yAvU77VmtS/bQf5LjeaQT9LV1vw8qjURjgOuj9rTo llqewQJ8QReOkn/v0e3TzAKLn7jWtQT1a4NCmjFTRgITF5VRMVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Folio Fiscal: 1aa08adc-f7fb-409c-8378-1670d08542d9

Serie Folio: G 54

Expedido en: 59800

Fecha: 02-04-2019 12:02:05

**DHAC SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA**

DHAC SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA RFC: DSI170607NX6  
603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

LA PEÑITA 106  
JACONA DE PLANCARTE CENTRO, CP 59800  
JACONA, MICHOACÁN, MEX  
Email: dhac@outlook.es Tel. (35) 1126 0101

||1.1|1aa08adc-f7fb-409c-8378-1670d08542d9|2019-04-02T12:06:48|DIG130917F9A|mOgkNeCoVS3j6An4oJU8scSc2rMMtA4jIT4YFdYzy/YpWA86/pdjh+DJV0bdkuIDSYmeuAGZ+pIZj3/O8TOKUdcOYko1gtmVAKMsS/XVK3WlrfMqjz7AmRulJB9mr0ahPFBf7M93Qfjxo/uptXK3+dGgnXGPOsmgmbIKlcz55ras+Zu8loCG+EaTfdKlhc39iVU9Q7lyAkLTS+rOM7QjuiDg3oqjC5I88GH892gkN3iAbmcgeZ9yVIQaaGj/sVOM+99yu+k9CPgGYp9CZvXO8D8U/5d4duxvAlSo6YhzHQYHujDFXieYVRjNHkTw1nrEcsfvQpMgbBiUIShyUitEA==|00001000000411500203||

**Notas para el Cliente:**

Validado y timbrado por:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO  
FONDO III  
FISM-DF**

**OFICIALIA MAYOR**

**ORDEN DE COMPRA**



H. AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA, MICHOACÁN  
 MORELOS No. 1 COL. CENTRO C. P. 59850  
 CHAVINDA, MICHOACÁN.

FOLIO		
No 0659		
DIA	MES	AÑO
02	04	19

AREA Obras Poblras U. VEHICULAR \_\_\_\_\_ REQUISICIÓN No. 0659

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	Obra. Electrificacion. en localidades La Esperanza, la Cestita, El Tepalcayo	
		N. fac. 54
		\$346,801.30

**OPERADO  
 FONDO III  
 FISM-OF**



NOMBRE Y/O FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA  
Ing. David Nino Zabala

FIRMA DEL OFICIAL MAYOR


# OFICIALIA MAYOR

AREA Obras U. VEHICULAR \_\_\_\_\_

REQUISICIÓN		
No <b>0659</b>		
DIA	MES	AÑO
02	09	19

- MATERIAL DE PAPELERIA
- EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS
- MANTENIMIENTO DE OFICINA Y MOBILIARIO
- MATERIAL ELECTRICO
- EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO
- REFACCIONES
- MATERIAL DE LIMPIEZA
- CONSUMIBLES
- VARIOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	Obra Electrificación en localidad El La Esperanza, la Cuestita El Tepalcates.	



OPERADO  
FONDO III  
FISM-DF

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

NOMBRE Y/O FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA  
Ing. David Nino Zabala

FIRMA DEL OFICIAL MAYOR



MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICHOACAN

# DHAC

**SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA  
S.A. DE C.V.**





LIBRAMIENTO SUR 1151 COL. EL NUEVO PORVENIR, JACONA MICHOACAN

**CARATULA DE ESTIMACION**  
ESTIMACION No. 1 (UNO) Y FINIQUITO  
FECHA: 02/04/2019  
PERIODO  
DEL: 19/03/2019 AL: 02/04/2019

R.F.C. <b>DSI170607NX6</b>	LOCALIDAD MUNICIPIO CONTRATO F.I.S. CONTRATO F.T.S. CONTRATO F.T.S. CONV. MODIF./RI: F.T.S. PRORROGA	Obra <b>Electrificación en localidades: La Esperanza, La Cuestita, El Tepehuaje</b>  La Cuestita, La Esperanza y El Tepehuaje. CHAVINDA, MICHOACAN OP/CHAV/04/AD/FI/03-2019 martes, 19 de marzo de 2019 martes, 14 de mayo de 2019	CONTRATADO \$ 498,500.00 AMPLIACION INCREMENTOS TOTAL \$ 498,500.00  30% DE ANTICIPO \$ 149,550.00 AMORT. ANTERIOR \$ - AMORT. ESTA ESTIM \$ 149,550.00 AMORTIZ. TOTAL \$ 149,550.00 POR AMORTIZAR \$ -
----------------------------	--	---	--

**ESTA ESTIMACION**

ESTIMADO.....	\$ 429,741.38
16% IVA.....	\$ 68,758.62
TOTAL.....	\$ 498,500.00
AMORT. ANTICIPO....	\$ 149,550.00
TOTAL.....	\$ 348,950.00
2% INSP. Y VIGILANCIA	\$ -
0.2% DE ICIC.....	\$ -
0.5 AL MILLAR DE VERI	\$ 2,148.71
ALCANCE LIQUIDO.....	\$ 346,801.29

<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ING. DAVID NIÑO ZAVALA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ING. DANIEL CORTÉS HUIRACHE DIRECTOR GENERAL</p>
<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ING. GUSTAVO ALBERTO SANTIBAÑEZ ROCHA RESIDENTE DE OBRA DE LA DEPENDENCIA</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ING. DANIEL CORTÉS HUIRACHE SUPERINTENDENTE DE OBRA DE LA EMPRESA</p>

OPERADO FONDO III FISM-DE

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER	AVANCES
CONTRATADO	\$ 429,741.38		\$ 429,741.38	\$ 429,741.38	\$ -	FISICO FINAL
IVA	\$ 68,758.62		\$ 68,758.62	\$ 68,758.62	\$ -	
TOTAL	\$ 498,500.00		\$ 498,500.00	\$ 498,500.00	\$ -	100.00% 100%
SANCION						



LIBRAMIENTO SUR 1151 COL. EL NUEVO  
PORVENIR. JACONA MICHOACÁN



**DHAC**  
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA  
S.A. DE C.V.

ESTIMACION DE TRABAJOS ORDINARIOS No. 1		CONTRATO		FECHA	AVANCE ECONOMICO	
ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO		OP/CHAV/04/AD/FI/03-2019		21/11/2018	100%	
H. AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA, MICHOACAN		FECHAS DEL CONTRATO		PERIODO		
OBRA:	Electrificación en localidades: La Esperanza, La Cuestita, El Tepehuaje	INICIO: 19/Marzo/2019		DEL:	19/03/2019	
		FIN: 14/Mayo/2019		AL:	02/04/2019	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE		OBSERVACIONES
				P.U	TOTAL	
<b>La Cuestita</b>						
C1	Suministro e instalación de poste 9-400 incluye herrajes, soportería, aislamiento, traslado hasta el lugar de trabajo, cepa, parado de poste por medio de grúa, plomeo y empotramiento en terreno blando.	pieza	4	\$ 10,713.67	\$ 42,854.68	
C2	Suministro e instalación de red de baja tensión 2+1 3/0-1/0, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	120	\$ 346.00	\$ 41,520.00	
C3	Suministro e instalación de retenidas en media tensión y baja tensión incluye, cepa, ancla cónica, perno ancla, cable retenida, remates preformados, aislador 4 r, guarda cabos , protector para retenida así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pieza	2	\$ 6,165.64	\$ 12,331.28	
C4	Pagos a C.F.E. supervisión, revisión, aprobación y libranza hasta conexión así como elaboración de primer y segundo paquete para ingresar la obra. Así como elaboración de proyecto eléctrico para ceder a C.F.E.	pieza	1	\$ 1,797.44	\$ 1,797.44	
<b>El Tepehuaje</b>						
T1	Suministro e instalación de poste 9-400 incluye herrajes, soportería, aislamiento, traslado hasta el lugar de trabajo, cepa, parado de poste por medio de grúa, plomeo y empotramiento en terreno blando.	pieza	3	\$ 10,713.67	\$ 32,141.01	
T2	Suministro e instalación de red de baja tensión 2+1 3/0-1/0, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	165	\$ 346.00	\$ 57,090.00	
T3	Suministro e instalación de retenidas en media tensión y baja tensión incluye, cepa, ancla cónica, perno ancla, cable retenida, remates preformados, aislador 4 r, guarda cabos , protector para retenida así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pieza	2	\$ 6,165.64	\$ 12,331.28	
T4	Pagos a C.F.E. supervisión, revisión, aprobación y libranza hasta conexión así como elaboración de primer y segundo paquete para ingresar la obra. Así como elaboración de proyecto eléctrico para ceder a C.F.E.	pieza	1	\$ 1,926.64	\$ 1,926.64	
<b>La esperanza</b>						
E1	Suministro e instalación de transformador monofásico tensión reducida 15 kva 13200/220-127, incluye instalación de conector perico, puente de cobre, suministro e instalación de corta circuito fusible así como bajante a tierra con electrodo. Incluye suministro e instalación de soporte cb1 con abrazadera 2uh y tornillo máquina para su correcta sujeción. Instalación por medio de grúa.	pieza	1	\$ 46,710.74	\$ 46,710.74	
E2	Suministro e instalación de poste de concreto 12-750, incluye traslado hasta el lugar de trabajo, cepa de 2 m de profundidad, parado por medio de grúa y vestido con herraje de acuerdo a estructuras mencionadas en proyecto.	pieza	4	\$ 12,737.99	\$ 50,951.96	
E3	Suministro e instalación de poste 9-400 incluye herrajes, soportería, aislamiento, traslado hasta el lugar de trabajo, cepa, parado de poste por medio de grúa, plomeo y empotramiento en terreno blando.	pieza	1	\$ 10,713.70	\$ 10,713.70	
E4	Suministro e instalación de red de baja tensión 2+1 3/0-1/0, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	35	\$ 346.00	\$ 12,110.00	
E5	Suministro e instalación de red de media tensión 2f-3h, incluye herraje de sujeción, aislamiento y todo lo necesario para su correcto funcionamiento en base a proyecto.	ml	207	\$ 381.30	\$ 78,929.10	
E6	Suministro e instalación de retenidas en media tensión y baja tensión incluye, cepa, ancla cónica, perno ancla, cable retenida, remates preformados, aislador 4 r, guarda cabos , protector para retenida así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pieza	4	\$ 6,165.64	\$ 24,662.56	
E7	Pagos a C.F.E. supervisión, revisión, aprobación y libranza hasta conexión así como elaboración de primer y segundo paquete para ingresar la obra. Así como elaboración de proyecto eléctrico para ceder a C.F.E.	pieza	1	\$ 3,670.99	\$ 3,670.99	
<b>SUBTOTAL HOJA 1</b>					<b>\$ 429,741.38</b>	
<b>EL IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN ES DE :</b>				<b>SUMA</b>	<b>\$ 429,741.38</b>	
				<b>I.V.A</b>	<b>16%</b>	<b>\$ 68,758.62</b>
<b>TOTAL ESTIMACION 1</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 498,500.00</b>	
(Cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.)						

**OPERADO  
FONDO III  
FISM-DF**

ING. DANIEL CORTÉS HUIRACHE  
DIRECTOR GENERAL

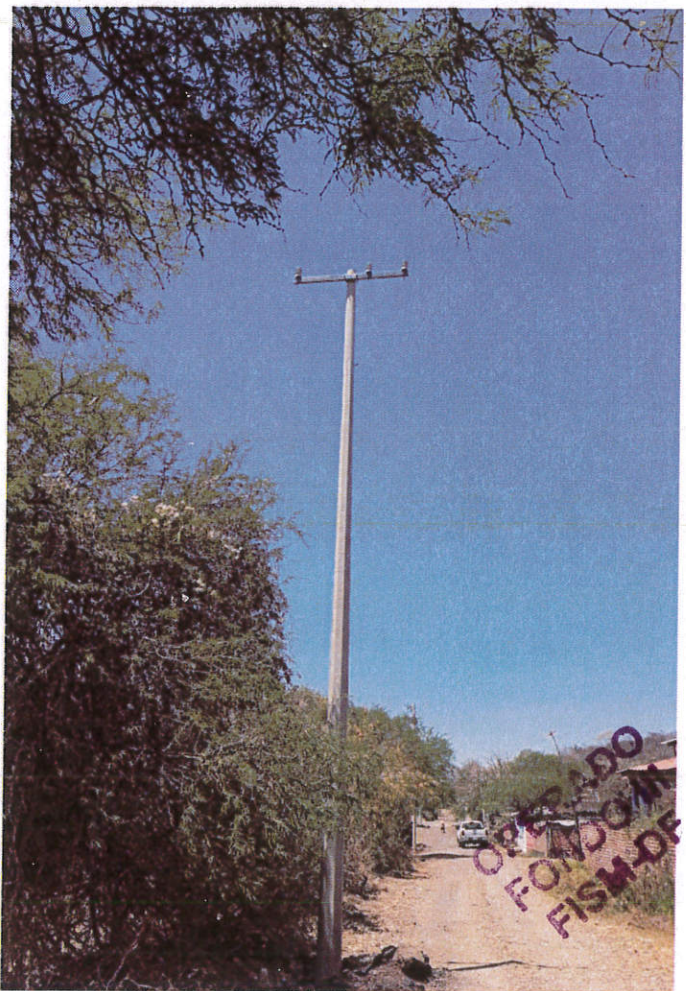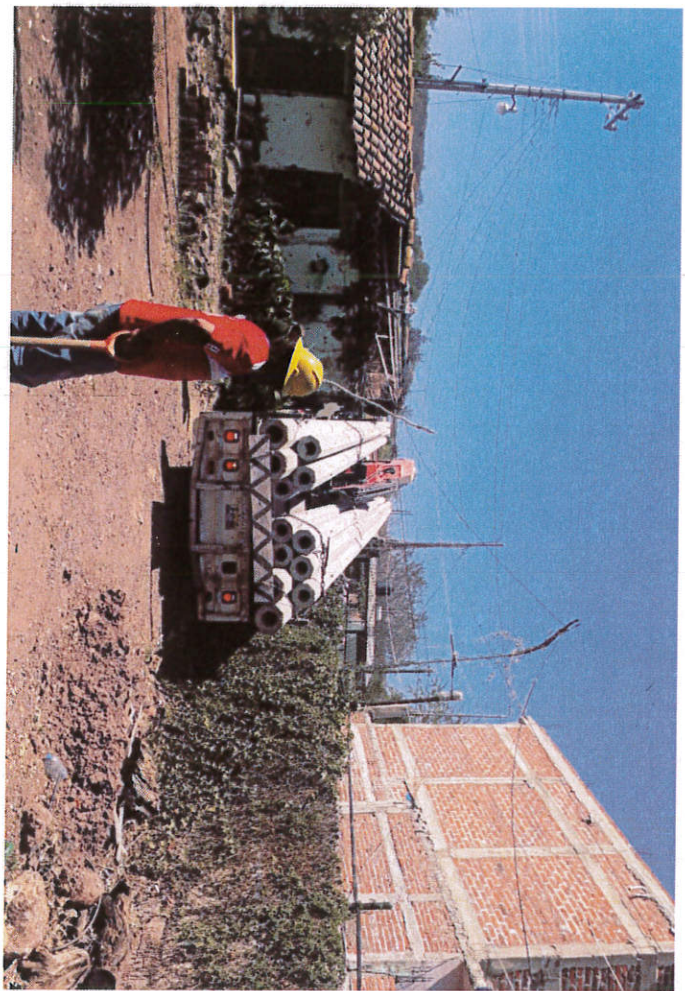

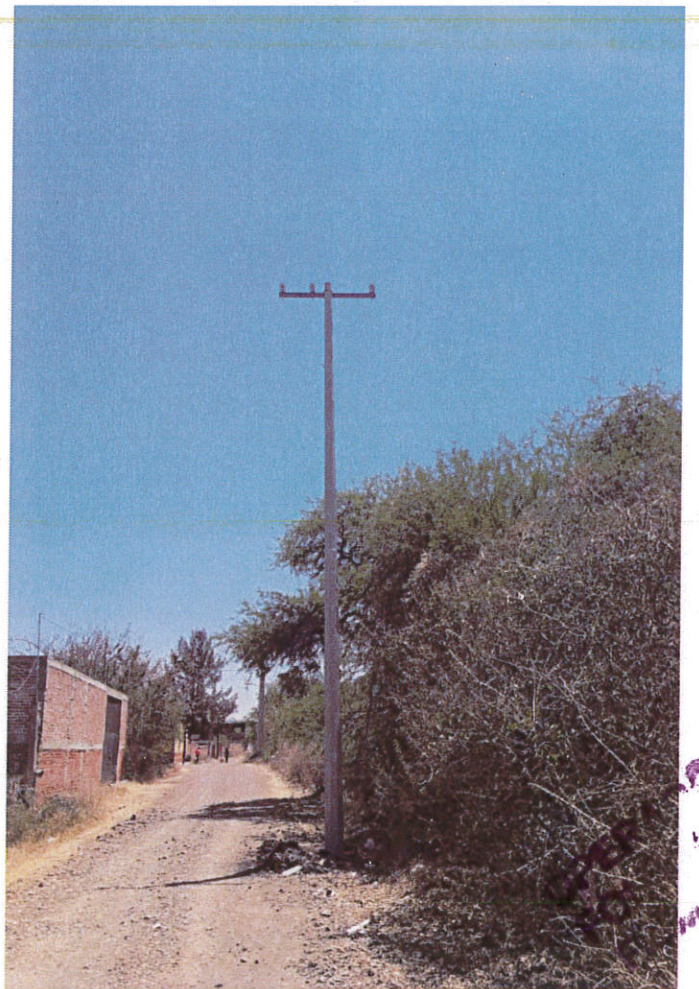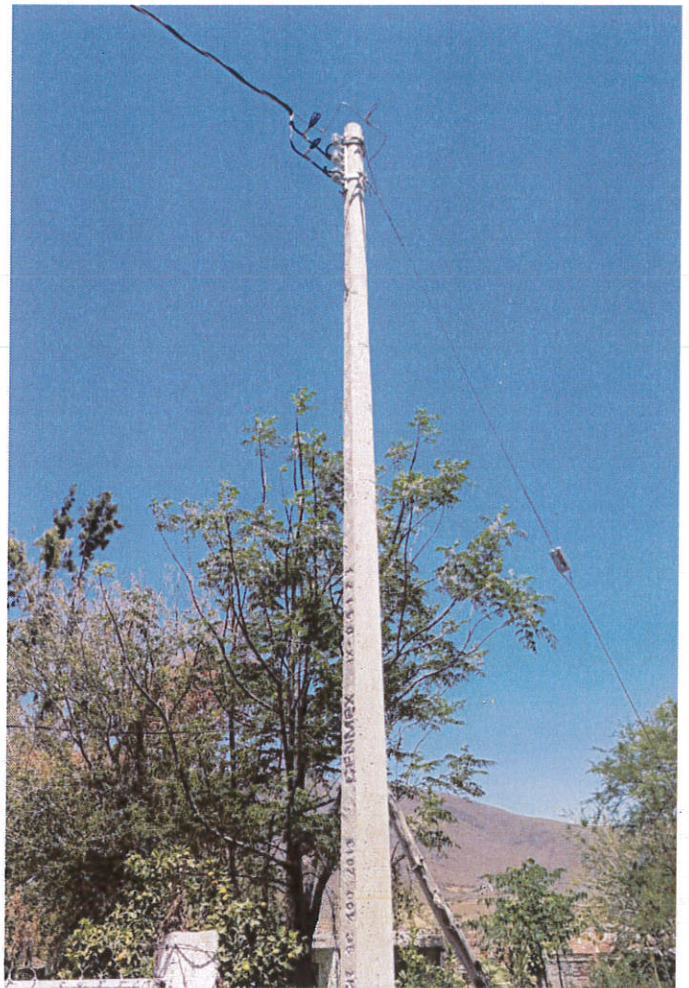

PHOTO
